

De marco aprobado *a operación*

Aterrizaje operativo de los **tres modos de trabajo** del Playbook v0.5. **Planes de marketing a la medida a solicitud de las marcas** (recepción → diseño → cotización → entrega → decisión de fondeo por la marca), Marketplace público en semanas 6 a 7 y compra de medios consolidada bajo **Medios Plasencia** con dos RFPs escalonados.

EN UNA FRASE

*Modelo a demanda · **planes de marketing a la medida cuando la marca los solicita: se recibe la solicitud, se diseña el planteamiento y la ejecución (branding + diseño + performance) se tercerizará vía RFP a agencias** — el planteamiento y la cotización de la agencia se ensamblan para que la marca decida si fondea. Marketplace público en **semanas 6 a 7**. RFP integral a agencias esta semana (marco Andrés: proveedores actuales de MKT + externas). **AI canonizada Answer-First**: Vambe se mantiene en SEM · CX se elige como AI cross-marca del flujo de adquisición del Marketplace (nace cross-marca por diseño · factibilidad de integración por evaluar). Gobierno del **Comité de Transformación Digital** desde semana 1.*

SPONSOR

Pepe Morales · Dirección de Finanzas · ronda de revisión con Andrés y Nicolás la semana siguiente al arranque.

OWNER OPERATIVO

Jesús Pérez Porras · Dirección de Marketing y Transformación Digital · team-of-one + IA · capacidad ~40 horas por semana.

VENTANA OPERATIVA · 13 SEMANAS

Sprint **S1 = semana 33 del 2026** (lunes 10 al domingo 16 de agosto) → **S13 = semana 45** (lunes 3 al domingo 9 de noviembre). **Tres reportes semáforo al Consejo**: S4 · semana 36 (fin de fase build · lunes 31 ago), S8 · semana 40 (Marketplace público operando · lunes 28 sep), S13 · semana 45 (cierre de 90 días con métricas medibles · lunes 3 nov). Comité de Transformación Digital formalizado en S1.

FILOSOFÍA · CALIDAD SOBRE COBERTURA, MEMORIA SOBRE PIPELINE

Fase 1 arranca con **4 marcas en piloto o confirmadas** (Seminuevos · Hyundai · Stellantis · GAC). Fase 2 suma **3 marcas de backlog activo** (Changan · Flotillas · Corporativo). El Marketplace público se recorta a S6-S7 porque *"la gente se acuerda de los últimos 30 días"*: la sensación de éxito debe estar vigente al reporte S13. Fase 3 (Autolease + resto) se activa por **pull** comercial, no por push.

Priorización por capacidad instalada

Team-of-one + IA cubre ~40 horas por semana efectivas. El Modo 1 (planes a la medida a solicitud) consume aproximadamente **3 a 5 horas por solicitud entregada** (recepción de solicitud → apoyo en el diagnóstico usando el gasto declarado en el SPA Directorio de Proveedores → diseño del planteamiento → cotización con costo transparente → entrega). El load depende del volumen de solicitudes que las marcas envíen — no se satura arriba porque no se opera por push. Nada se impone; el trabajo escala sólo con las solicitudes recibidas, dejando espacio para el build del Marketplace (Modo 2) y los RFPs de Medios Plasencia (Modo 3).

A PRIORIZACIÓN CANONIZADA · 3 FASES

FASE 1 · SEMANAS 1 A 5

Confirmadas o en piloto

Pilotos operando o solicitud explícita en cola. Arranque escalonado (una por semana) según lleguen solicitudes.

Planteamientos a la medida diseñados, cotizados y entregados — la marca decide si fondea la ejecución.

Seminuevos

Hyundai

Stellantis

GAC

FASE 2 · SEMANAS 5 A 11

Backlog activo + Corporativo

Se abren a solicitud cuando Fase 1 tiene planteamientos entregados. La lógica: si el modelo **a demanda (planes a la medida entregados y fondeados por la marca) + canal propio (Marketplace)** funciona con Fase 1, se abre a estas marcas y se van **absorbiendo iniciativas del BAU** (operación actual con agencias externas y canales dispersos) que la marca decida traspasar. Flotillas mantiene funnel B2B propio, no entra al Marketplace público.

Changan

Flotillas

Corporativo

FASE 3 · SEMANAS 12 A 13

Pull explícito o esperan

Autolease entra por solicitud explícita (ya solicitado). El resto solo se activa si el Consejo o las Direcciones de Familia empujan top-down, o si el Director de Marca lo pide con solicitud expresa.

Modelo pull, no push.

Autolease

Mazda

Ford

GWM

Isuzu

B LOS 3 MODOS ATERORIZADOS EN 90 DÍAS

01

PLANES A LA MEDIDA A SOLICITUD

Diseñar → cotizar → entregar · la marca decide si fondea

Modelo a demanda. Se recibe la solicitud de la marca (Dir Familia · Dir Marca · Gte MKT), se diseña el planteamiento de marketing a la medida (apoyado en el mapeo del gasto declarado por la marca en el SPA Directorio de Proveedores), se cotiza con costo transparente y se entrega. La marca decide si fondea la ejecución u operación. **Meta 90 días: al menos 1-2 planteamientos entregados y fondeados por marca de Fase 1;** Fase 2 se abre conforme lleguen solicitudes.

02

LEAD A VENTA

Marketplace público + ecosistema Karbot

Marketplace del Grupo Plasencia con las 5 marcas de retail (Flotillas mantiene funnel B2B aparte). Cada marca sube su feed de catálogo y opera como *tiendita*. Encima corre el ecosistema Karbot: IA conversacional + encuestas NPS + broadcast + Karlopay para pagos digitales. **Meta 90 días: público operando en S6-S7 con 5 marcas.**

03

MEDIOS PLASENCIA

RFP integral a agencias · medios + ejecución

Compra de medios y *ejecución integral* (branding, diseño, performance) cross-marca vía RFP a agencias. **RFP #1 · Digital + ejecución integral** — sale esta semana, incluye *proveedores actuales de MKT + externas* (marco Andrés). **RFP #2 · Off/análogos** (OOH, radio, TV · firma S12). Sergio (Compras) en cc desde primer email. Fase 2 post-90d: constituir Medios Plasencia como entidad formal.

GOBIERNO DEL PLAN · COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Se formaliza en semana 1 como órgano de gobierno permanente. Composición: **Andrés y Nicolás (Direcciones de Familia), Pepe Morales (Dirección de Finanzas), Jesús Pérez Porras (Dirección de MKT y TxD), Sergio (Dirección de Compras)** como *validador operativo*. Se invita a *Directores de Marca* puntualmente según el tema. El Comité vota decisiones cross-marca.

Diseñar → cotizar → entregar · *la marca decide si fondea*

Modelo **a demanda**. La Dirección de MKT Corporativo no llega con recomendaciones prescritas ni impone un plan a la marca. Cuando el Director de Familia, el Director de Marca o el Gerente de MKT lo **solicitan**, se diseña un planteamiento de marketing a la medida de esa marca, con visibilidad completa del gasto que la propia marca ya declaró en el *SPA Directorio de Proveedores*. El planteamiento se **cotiza con costo transparente** (medios + operación + fees) y se **entrega**. La marca decide si el planteamiento hace sentido y, si lo hace, fondea la ejecución u operación.

A PROCESO · 4 PASOS POR SOLICITUD

PASO	DURACIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE
1. Recepción de solicitud	Al ingresar	Dir Familia / Dir Marca / Gte MKT envía · Dir MKT Corp recibe	Brief con el objetivo, el contexto y las preguntas de la marca
2. Diseño del planteamiento a la medida	2 a 4 días hábiles	Dir MKT Corp (con apoyo del gasto declarado en el SPA)	Draft del planteamiento · líneas prioritarias · KPIs propuestos · supuestos
3. Cotización	1 a 2 días	Dir MKT Corp	Costo transparente: medios + operación + fees (agencia y/o proveedores)
4. Entrega + decisión de fondeo	Sesión 45 min con la marca	La marca decide	Sí fondea (arranca ejecución u operación) · No fondea (queda documentado, sin costo)

B VOLUMEN ESPERADO 90 DÍAS · EL TRABAJO ESCALA CON LAS SOLICITUDES

No hay calendario prescrito por marca. El load real depende de cuántas solicitudes envíen las marcas de Fase 1 y Fase 2. El estimado de trabajo es **3 a 5 horas por solicitud entregada** (recepción → diseño → cotización → sesión de entrega). El escalonamiento canónico esperado es que las **marcas ya en piloto o confirmadas (Seminuevos, Hyundai, Stellantis, GAC)** envíen solicitud primero conforme cierran sus pilotos y necesitan planeación para Crecimiento; las marcas de Fase 2 se abren conforme reciban visibilidad del modelo.

ESTADO ESPERADO POR MARCA AL S13	MARCA	ESCENARIO BASE
Fase 1 · pilotos → Crecimiento	Seminuevos	Planteamiento entregado y fondeado · en operación (Crecimiento con 8 tramos)
	Stellantis	<i>Ya en curso</i> · solicitud directa de Enrique Rojas (consejero asignado a la dirección de Stellantis) · planteamiento en diseño
	Hyundai	Solicitud pendiente → si llega, planteamiento entregado y cotizado antes de S8
	GAC	Solicitud pendiente → si llega, planteamiento entregado y cotizado antes de S13
Fase 2 · a solicitud	Changan	<i>Ya solicitó apoyo</i> · planteamiento en diseño (se suma a Fase 1 de facto)
	Flotillas	Solicitud opcional · flujo B2B ya en revisión con Aurora + Pepe
	Corporativo	Solicitud opcional · queda en cola

MATERIALES REQUERIDOS · A CONSTRUIR EN SEMANA 0

Template de Solicitud (formato mínimo: objetivo, contexto, preguntas de la marca) · **Template de Planteamiento a la medida** (1 pág A4, 5 secciones: diagnóstico apoyado en gasto declarado · líneas prioritarias · KPIs · presupuesto propuesto · supuestos) · **Template de Cotización** (medios + operación + fees desglosados) · **Bitácora de solicitudes** (registro de qué

Marketplace público · Grupo como plataforma

Concepto canonizado: **Grupo Plasencia = Marketplace · cada marca = tiendita**. La publicidad se ejerce como Grupo Plasencia (no marca individual) para eliminar restricciones OEM sobre la palabra "Marketplace" y sobre logotipos. Las marcas conservan capacidad creativa: suben catálogo propio, fotos, descripciones y ofertas al Marketplace del Grupo en lugar de tenerlos regados en Facebook Marketplace externo. **Flotillas no entra al Marketplace**: mantiene su landing dedicada a arrendadoras corporativas (segmento AAA) con funnel B2B propio.

A SPLIT DE RESPONSABILIDAD · QUIÉN HACE QUÉ

ETAPA DEL FUNNEL	DIRECCIÓN MKT Y TXD	LA MARCA
Producto digital + canal	Landing Marketplace · feed catálogo · Karbot cross-marca · atribución	Sube y mantiene inventario, fotos, descripciones
Registro → cita agendada <i>KPI MKT</i>	Pauta Meta+Google · Karbot atiende, califica, agenda	Fondea piso (\$35K/mes desde S6-S7)
Cita → visita → cierre	Customer Success confirma cita · hand-off · NPS post-visita	Vendedor digital garantiza visita, cierra, registra en DCA
Retroalimentación al motor	Loop show/no-show + venta cerrada · optimiza campañas	Reporta show/no-show y venta cerrada

B ROADMAP · BETA INTERNO S3-S4 · PÚBLICO S6-S7

SEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
S1-S2	Especificación producto + arquitectura + build backend (Worker + D1 + Karbot). Escalar CS a Consejo. RFP Carbot vs Vambe arranca.	Backend funcional + solicitud CS + brief RFP IA
S3-S4	Build frontend + integración landings. Beta interno con Seminuevos + Hyundai + Stellantis . Reporte al Consejo (fin fase build).	Beta interno · 3 marcas activas · reporte S4
S5	CS onboarded. Onboarding GAC + Changan. SOP formal de retroalimentación.	CS operando · 5 marcas retail activas
S6-S7	Beta público con 5 marcas retail . Arranque Meta+Google con piso \$35K/mes por marca. Karbot completo (IA+NPS+broadcast+Karlopay).	Marketplace público · campañas activas · métricas visibles
S8-S13	Operación estable · ~30 días de operación real antes del reporte S13.	3 reportes semáforo intermedios

AUTORIZACIÓN CUSTOMER SUCCESS + PISO \$35K/MES PAUTA PURA

Customer Success reportando a MKT es requisito para beta público. Sin el rol, loop show/no-show depende del voluntarismo comercial y el motor pierde señal. Escalado al Consejo semana 1 · respuesta esperada a más tardar S3.

Piso \$35K MXN/mes por marca de pauta pura se activa hasta S6-S7 cuando el Marketplace de la marca está levantado. Mientras se construye no se enciende pauta. Soporte operativo (trafficker, MKT Ops adicional) se cotiza aparte vía ganador del RFP #1 Digital + implants.

Compra consolidada *bajo entidad propia*

Medios Plasencia es el brazo operativo cross-marca. Referencia estructural: **KPMG · BienSea · GP Autolease**. Fase 1 (dentro de los 90d) es un **RFP integral** — no solo compra de medios sino también ejecución de branding, diseño y performance marketing. El ganador se convierte en el brazo ejecutor de MKT Corp. Fase 2 (post-90d) constituye la empresa formal. **Sergio (Compras) en cc desde el primer email**. Marco explícito de Andrés: *incluir a todos los proveedores actuales de MKT para que puedan participar* junto con externas.

A RFP #1 · DIGITAL + EJECUCIÓN INTEGRAL · FIRMA S5

SEM	ACTIVIDAD	MATERIALES
S1-S2	Brief formal con Sergio (Compras) y Pepe (Finanzas) · alcance integral (medios + branding + diseño + performance) · criterios ponderados · invitación a <i>proveedores actuales de MKT + externas</i> (marco Andrés) · NDA.	Doc RFP + matriz + NDAs
S3-S4	Recepción propuestas · scoring técnico (Chucho) y económico (Pepe) · presentación 30 min al Comité de TxD · voto ponderado.	Matriz poblada + acta selección
S5	Notificación · negociación contractual. Contrato firmado · onboarding del ganador antes del arranque piso \$35K.	Contrato + plan onboarding

B RFP #2 · OFF/ANÁLOGOS · ARRANCA S8 · FIRMA S12

SEM	ACTIVIDAD	MATERIALES
S8-S11	Preparación RFP Off (OOH, radio, TV, prensa) · criterios de dinámica análoga · invitación (2 medianshops + 1 comodín) · recepción y scoring.	Doc RFP + matriz + propuestas
S12	Voto ponderado Comité TxD · notificación · negociación. Contrato Off firmado .	Acta + contrato firmado

C AI CONVERSACIONAL · BENCHMARK → HOMOLOGACIÓN CON CX ANSWER-FIRST

Seminuevos	Vambe se mantiene — contrato vigente · integración operativa en producción · es uno de los 3 habilitadores de la trazabilidad punta a punta.
Marcas de nuevos (HYU, STL, GAC, Changan, Flotillas)	Cada marca mantiene su AI conversacional actual hasta fin de año . No se fuerza migración de golpe. Se convive con lo existente mientras se levanta el benchmark.
Reporte obligatorio de las marcas	Mensualmente cada marca reporta el <i>embudo completo</i> de su AI: conversaciones · leads · citas agendadas · visitas realizadas · ventas , junto con sus inversiones de MKT vinculadas a esos esfuerzos. Con esa data MKT Corp calcula costo por etapa y compara rendimiento entre herramientas.
CX Answer-First (Marketplace)	CX se elige como AI cross-marca del flujo de adquisición del Marketplace — Answer-First porque CX nace cross-marca por diseño y converge con el Marketplace (también cross-marca). Factibilidad de integración por evaluar (arquitectura · SLA · alcance).
Meta · homologación	Con el benchmark del semestre + la integración CX evaluada, se define la homologación de la experiencia operativa y conversacional hacia 2027. La marca gana en foco (una sola herramienta) · el Grupo gana en control cross-marca.
Plan B eventual · Digital Factory	Si por alguna razón CX no resulta viable como AI cross-marca del Marketplace, Chucho ensambla equipo o iniciativa Digital Factory para desarrollarla desde el Grupo. El alcance no se limita a la AI: atiende todo el ecosistema de aplicaciones + roadmap del Marketplace que se irá derivando conforme escale.

En estos 90 días MKT Corp solo garantiza la **entrega de la beta del Marketplace**. Vambe sigue en

Siete acuerdos *que enmarcan la ejecución*

Los siguientes siete acuerdos **se acordaron con Andrés Plasencia el 17 de agosto de 2026** en la revisión del plan de marketing. Cada uno se clasifica como *ya pasando* (en ejecución), *siguiente* (arranca esta semana o la próxima) o *acuerdo* (marco de decisión). El acuerdo transversal es que **MKT Corp opera como Marketing Ops que orquesta · la ejecución (branding, diseño, performance marketing) se tercerizará vía el RFP integral a agencias**. Chucho no ejecuta directamente; la capacidad operativa se construye a través de proveedores contratados.

A LOS SIETE ACUERDOS


#	ACUERDO	ESTATUS	OWNER / SIGUIENTE PASO
1	Pitch Marketplace Plasencia · 14 de agosto con Directores y Gerentes de MKT · pitch de proyecto + demo + siguientes pasos para implementación.	Siguiente · 14-ago	Chucho conduce la reunión.
2	Despliegue operativo por agencia GDL post-14-ago con Gerentes Generales, de Ventas y de MKT de cada agencia.	Acuerdo	Se agenda en cascada tras el pitch del 14-ago.
3	AI conversacional: Vambe sigue en SEM · cada marca mantiene su AI actual hasta fin de año reportando el embudo completo (conversaciones · leads · citas · visitas · ventas + inversiones MKT) para calcular costo por etapa y comparar herramientas · CX Answer-First como AI cross-marca del flujo del Marketplace (integración por evaluar) · benchmark → homologación futura · <i>plan B eventual · Digital Factory</i> si CX no viable.	Ya pasando	Marcas empiezan a reportar embudo · reunión técnica CX para evaluar integración · Sergio en cc.
4	Seminuevos ago-sep con mayor inversión — Consejo ya dio VoBo del presupuesto Crecimiento (\$60K/mes prorrateado en 8 tramos + 8% Viceversa + IVA = \$75,168 MXN mensuales).	Ya pasando	Directores de marca fondean su tramo · MKT Corp reporta punta a punta en DCA.
5	Piloto Flotillas · VoBo Aurora + Pepe · agendar cita para presentación formal del piloto B2B.	Siguiente	Chucho revisa y agenda con Aurora + Pepe.
6	RFP proveedores de medios · sale esta semana. Alcance integral (medios + branding + diseño + performance). Incluye a <i>todos los proveedores actuales de MKT</i> para que puedan participar + agencias externas.	Siguiente · esta semana	Chucho + Sergio (Compras) + Pepe (Finanzas) escriben el brief.
7	Reunión con áreas de MKT para explicar llenado ene-jul del formulario de gasto: personas 100% dedicadas MKT · personas híbridas · iguales de proveedores · gasto publicitario. Usa el SPA Directorio de Proveedores.	Siguiente	Chucho conduce con todas las áreas MKT. Baseline para RFP y para Marketing Ops.

MARCO TRANSVERSAL · MKT CORP ORQUESTA · AGENCIAS EJECUTAN

Chucho como team-of-one + IA construye **Marketing Ops**: la capacidad interna para diseñar estrategia, escribir RFPs, seleccionar proveedores, medir contra DCA y reportar. **La ejecución de branding, diseño y performance marketing (Google, Meta, creativos, campañas) se tercerizará** con la agencia ganadora del RFP integral. Este es el modelo operativo canonizado con Andrés — permite escalar sin depender de contratar equipo interno de ejecución.

Timeline 90 días *y capacidad instalada*

A TIMELINE CONSOLIDADO · 13 SEMANAS · S1 (SEMANA 33) → S13 (SEMANA 45)

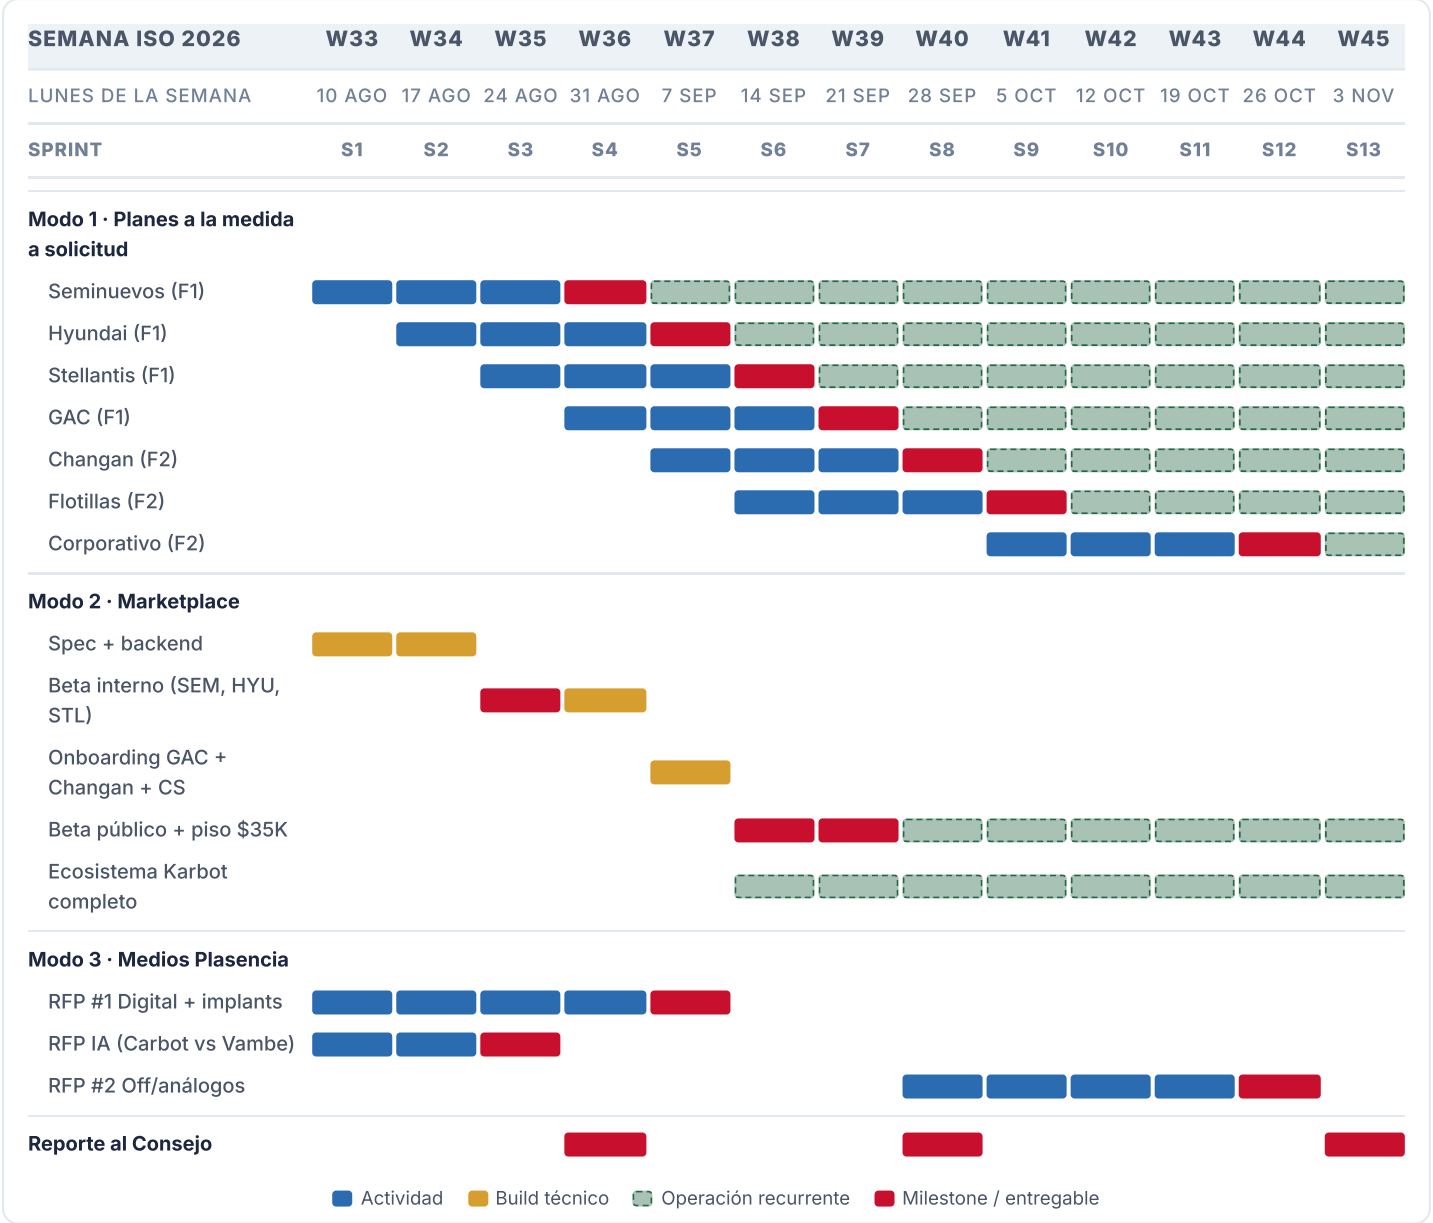

B CAPACIDAD ESTIMADA · SEMANAS 1 A 8 (FASE PICO)

ACTIVIDAD	HORAS POR SEMANA	NOTAS
Modo 1 · Planes a la medida (a solicitud de las marcas)	3 a 12	Depende de cuántas solicitudes lleguen · 3 a 5 h por solicitud entregada (recepción → diseño → cotización → entrega) · sin techo prescrito, escala con demanda real
Modo 2 · Marketplace build, beta y ecosistema Karbot	12 a 16	Intensivo en S1-S5. Reduce cuando entra a operación en S6-S7
Modo 3 · Medios Plasencia (RFP #1 + RFP IA)	3 a 5	Concentrado en S1-S5. RFP #2 arranca en S8
Reportes al Consejo · admin	5 a 7	Preparación de reportes semáforo mensuales
Total	40 a 52	Se ajusta con IA. En pico requiere concentración.

Métricas de éxito *y mitigación de riesgos*

A MILESTONES Y MÉTRICAS DE ÉXITO POR REPORTE AL CONSEJO

REPORTE 1 · SEMANA 4 Fin fase build → Planteamiento a la medida entregado y fondeado para Seminuevos · en operación (Crecimiento) → Stellantis con solicitud directa de Enrique Rojas y Changan con solicitud propia · ambos planteamientos en diseño → Hyundai y GAC · solicitudes pendientes → Beta interno del Marketplace operando con Seminuevos + Hyundai + Stellantis → RFP #1 Digital + implants en fase de voto del Comité · RFP IA con Carbot y Vambe resuelto → Comité de TxD formalizado y sesionando	REPORTE 2 · SEMANA 8 Marketplace público operando → 4 marcas Fase 1 con planteamiento entregado y cotizado (SEM, HYU, STL, GAC) · SEM y al menos otra fondeada por la marca → Fase 2 abierta a solicitud · Changan y Flotillas con solicitudes recibidas → Marketplace público operando desde S6-S7 · 5 marcas retail activas · piso \$35K por marca encendido · Karbot completo → Contrato RFP #1 Digital + implants firmado · implants onboarded · RFP #2 Off arrancando → Comité de TxD con 2 votaciones documentadas	REPORTE 3 · SEMANA 13 Cierre 90 días · modelo demostrado → Planteamientos entregados y cotizados a las 7 marcas que enviaron solicitud (4 Fase 1 + 3 Fase 2 · SEM, HYU, STL, GAC, Changan, Flotillas, Corporativo) · N de ellos fondeados por la marca y en ejecución → Fase 3 activada por pull (Autolease en cola) → Marketplace con ~30 días de operación real · ventas incrementales medibles → Ahorro medible en compra de medios (baseline Daniel Galindo vs consolidado Medios Plasencia) → Modelo demostrado como área de servicio a demanda + canal propio · listo para crecer y para que más marcas traspasen iniciativas del BAU al MKT Corporativo en 2027
---	---	--

B RIESGOS IDENTIFICADOS Y MITIGACIONES

RIESGO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Consejo no autoriza CS en S1-S3	Media	Beta interno S3-S4 opera sin CS · beta público se retrasa 2 semanas hasta autorización.
Marcas Fase 1 no envían solicitudes	Media-alta	Direcciones de Familia socializan disponibilidad del servicio. Si tras 4 semanas ninguna marca envía solicitud, se comunica al Consejo y se ajusta el plan.
RFPs no atraen ofertas competitivas	Baja	Agencias actuales del Grupo ya están invitadas + 1 comodín. Sergio valida representatividad del pool.
Marketplace beta rompe UX landings	Media	Deploy en URL separada · landings actuales intactas hasta que el beta público esté estable.
La marca no fondea el planteamiento entregado	Media	El planteamiento queda documentado sin costo · cero recursos comprometidos por el Grupo · retroalimentación para próxima iteración.

FILOSOFÍA · DEMOSTRAR ANTES DE ESCALAR · VER ANEXO PARA EVOLUCIÓN POST-90D

El éxito de estos 90 días se mide por si el modelo MKT Corporativo (**área de servicio a demanda + canal propio Marketplace**) demuestra que funciona con las marcas Fase 1 que envían solicitud. Si lo hace, más marcas envían solicitud y van traspasando iniciativas del **BAU** (agencias externas, canales dispersos) al MKT Corporativo poco a poco. Métrica: planteamientos fondeados por las marcas + ventas incrementales del Marketplace + ahorro Medios Plasencia + credibilidad para crecer. La progresión post-90d (empresa formal, white label, suite abierta) vive en el *Anexo · Medios Plasencia · Evolución del modelo.*
